



Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie

ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw

www.krasnystaw-powiat.pl
e-mail: starostwo@krasnystaw-powiat.pl

Krasnystaw, dnia 29.02.2024 r.

BRZ.0003.6.2024

**Pan
Krzysztof Jacek Zieliński
Radny Rady Powiatu
w Krasnymstawie**


W załączeniu przekazuję odpowiedź Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Krasnymstawie na złożoną przez Pana na ostatniej Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie w dniu 15 lutego 2024 r. interpelację w sprawie informacji z postępu prac projektowych dotyczących opracowania dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej relacji Krasnystaw – Niemienice.

STAROSTA

Andrzej Leńczuk



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W KRASNYMSTAWIE
UL. BOROWA 6, 22 – 300 KRASNYSTAW

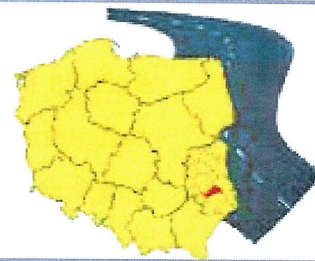

Krasnystaw, dnia 29.02.2024 r.

SPZP.4116.6.2024.ER

Pan Krzysztof Zieliński
Radny Rady Powiatu Krasnystaw

Dotyczy: Interpelacji złożonej przez Pana Krzysztofa Zielińskiego – Radnego Rady Powiatu Krasnystaw w sprawie opracowania dokumentacji projektowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3121L Krasnystaw – Niemienice od km 2+188 do km 8+694 dł. 6,506 km”

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie opracowania dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 3121L relacji Krasnystaw - Niemienice, Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie informuje, że:

- 1) mediacje z wykonawcą Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o. o. Al. Grunwaldzka 56/202, 80 – 241 Gdańsk Adres do korespondencji: ul. Leszczynowa 55, 87-100 Toruń realizującego zadanie pod nazwą: Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3121L Krasnystaw – Niemienice od km 2+188 do km 8+694 dł. 6,506 km” zostały podjęte w celu uregulowania kwestii ostatecznego terminu dostarczenia kompletnej dokumentacji projektowej oraz warunków finansowych i wysokości kar umownych. Termin realizacji umowy nr 2/PN/20 z dnia 25.03.2020r. zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą upłynął dnia 30.06.2022 roku. Pomimo kolejnych wezwań wykonawca nie podjął działań zmierzających do zakończenia realizacji umowy. Jednocześnie pojawiły się z jego strony żądania waloryzacji wynagrodzenia z uwagi na istotny wzrost kosztów wykonania brakujących elementów projektu. Kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczyły wartość całej umowy i zaistniała uzasadniona obawa, iż wykonawca nie zakończy realizacji projektu dążąc do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego co wiąże się z karą umowną w znacznie mniejszej wysokości (10% wartości umowy). Jednocześnie, z uwagi na czas poświęcony wykonaniu umowy, stopień zaawansowania realizacji projektu oraz znacznie wyższe koszty przygotowania dokumentacji projektowej według aktualnych cen rynkowych zasadne było podjęcie mediacji z wykonawcą celem doprowadzenia do zakończenia realizacji umowy i dostarczenia brakujących elementów projektu.
- 2) Koszt mediacji jaki poniósł Powiat wynosi: 2.000,00 zł
- 3) Powiat Krasnostawski jest stroną wspomnianej ugody.
- 4) Zgodnie z art. 183 (4) k.p.c. postępowanie mediacyjne nie jest jawne. Mediator ani żadna ze stron lub osób biorących udział w postępowaniu nie może ujawnić uzyskanych w toku

Sekcja: SPZP

mediacji informacji ani relacjonować jej przebiegu w żaden sposób. Strony mogą zwolnić mediatora lub inne osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym z tego obowiązku, jednak zgoda udostępnienia tajemnicy mediacji wymaga zgody obu stron. Mediacja różni się w tym zakresie zatem od przebiegu postępowania przed sądem, co wprost wynika ze szczególnego charakteru tej instytucji. W związku z tym udzielenie informacji o przebiegu mediacji osobom trzecim nie jest możliwe.

DYREKTOR

Marek Plus

Do wiadomości:
Biuro Rady i Zarządu Powiatu
